



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 13º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230319.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA – PA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025, CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA

- 1. A despesa com a execução da(s) Obra(s) de Perfuração de Poço(s) Semiartesiano(s) objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2025 Projeto 1213.171220601.1.059 Ampliação do Microsistema de Água e Esgoto na Sede, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Exercício 2025 Projeto 1213.171220601.1.060 Ampliação do Microsistema de Água na Zona Rural e Garimpeira, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações.

A empresa **M.C.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 27 de outubro de 2025, que durante a execução dos serviços foram identificados condições técnicas distintas daquelas inicialmente previstas no projeto, tais como: dificuldade de acesso à algumas comunidades, variação na formação do solo e necessidade de realizar manutenção nas máquinas, por esses motivos solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) para que possa concluir a obra.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, conforme ofício em anexo.


Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 98/2025

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: 13ª (DECIMO TERCEIRO) Aditivo de Prazo de Execução
LICITAÇÃO DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023-CP
CONTRATO Nº: 20230319

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes,

Em atenção à necessidade de adequação do Contrato Nº20230319, vem-se por meio desta apresentar a devida justificativa para a solicitação de aditivo de prazo de execução, conforme segue:

Durante a execução dos serviços, foram identificadas condições técnicas e geológicas distintas daquelas inicialmente previstas no projeto, tais como: dificuldade de acesso a algumas comunidades, variação na formação do solo, manutenção nas máquinas precisando fazer o deslocamento até a cidade, necessidade de maior profundidade para atingir o aquífero ou adequação na vazão estimada. Assim dificultando a execução no tempo hábil, mesmo assim a equipe estar empenhada na finalização dos poços

Essas alterações são necessárias para garantir a qualidade, segurança e eficiência da obra, bem como assegurar o pleno atendimento aos objetivos do contrato original, evitando prejuízos estruturais e garantindo o correto funcionamento do poço após sua conclusão.

Portanto por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR 13ª (DECIMO TERCEIRO) ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 60 (Sessenta) dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

- ✓ COMUNIDADE PENEDO
- ✓ COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA
- ✓ COMUNIDADE IPAUPIXUNA
- ✓ CAMPO VERDE IV
- ✓ CAMPO VERDE III

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 27 de Outubro de 2025

M C R SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128

Assinado de forma digital por M C R
SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 41.520.118/0001-28

MANUELLA COELHO REBELO DOS SANTOS

CPF: 858.036.262-87

93 99124-4554




@construservloc



Construserv Loc

Av. Santa Catarina, Nº100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA


Relatório Fotográfico: Comunidade do Penedo

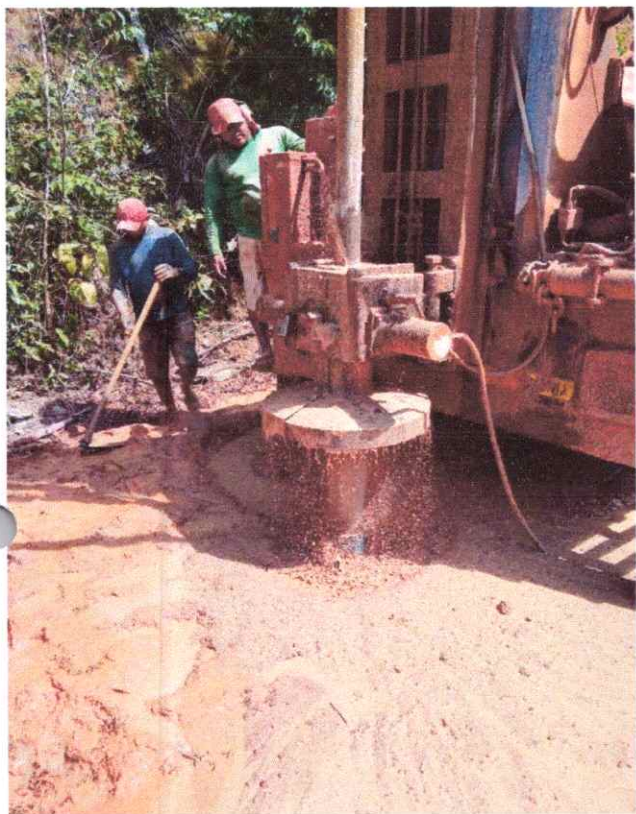

Relatório Fotográfico – Comunidade Nova Esperança



Relatório Fotográfico: Comunidade Ipaupixuna

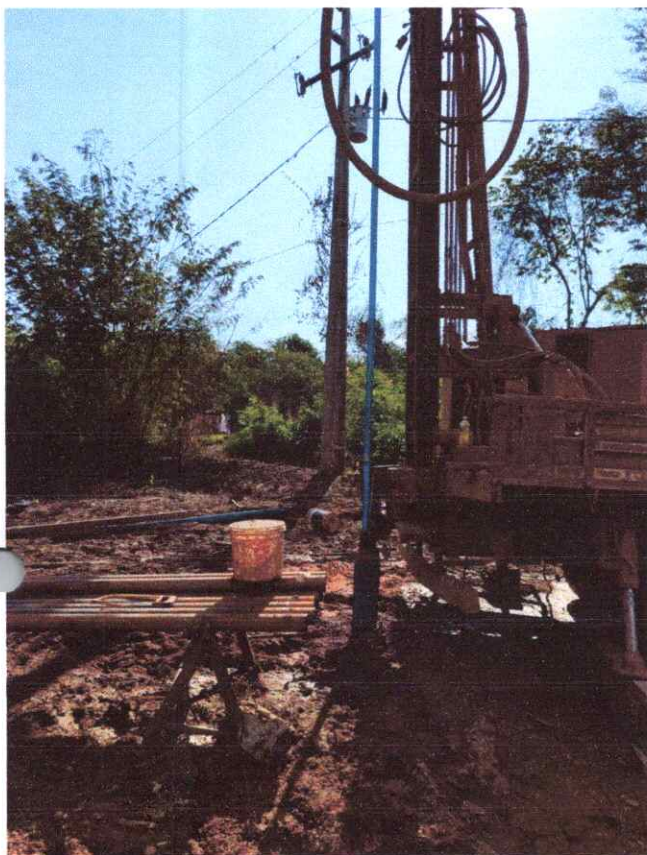

Relatório Fotográfico – Comunidade de Campo Verde IV



Relatório Fotográfico – Comunidade de Campo verde III

