



MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO:

Este Memorial Descritivo tem como objetivo relatar os serviços necessários para a construção de um CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE.

As presentes especificações têm por finalidade descrever de forma clara, os serviços a serem executados e materiais a empregar, definindo normas e condutas técnicas a serem observadas, e segue nos itens abaixo.

2. INTRODUÇÃO:

Tais especificações têm por objetivo fixar as condições gerais e específicas que deverão ser obedecidas na elaboração da obra.

Essas especificações acompanham os elementos gráficos do projeto arquitetônico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo – especificações gerais especificações particulares e elementos gráficos e outras recomendações, complementam-se e não devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observância a cada uma delas é indispensável ao êxito na execução do serviço. Qualquer divergência entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas prevalecerá estas últimas e entre os desenhos e as especificações prevalecerão às especificações da equipe técnica da Prefeitura.

Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterização de materiais ou produtos a través de denominações, fabricantes ou em indisponibilidade do mercado, fica subentendida a alternativa "ou rigorosamente similar de mesma qualidade", a qual deverá ser consultada com prévio aviso a equipe técnica da Prefeitura.

Caberá à equipe técnica da Prefeitura, sempre que preciso exigir do responsável pela execução da obra ou efetuar por iniciativa própria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessário, de modo a preservar sua boa qualidade.

3. LOCALIZAÇÃO:

Município de ITAITUBA-PA. COMUNIDADE RURAL CALIFÓRNIA
Coordenadas: E 571857 – S 9526622


José Alcy Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

4. SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra:

A empresa deverá providenciar placa indicativa da empresa executora e do responsável técnico pela execução (placa da empresa).

Também deverá providenciar placa informativa da obra conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal.

Na placa padrão do município e demais placas deverão constar informações:

- N° do convênio
- Município
- Início da obra
- Prazo da obra
- Valor total do convênio
- Valor da contrapartida municipal
- Valor do repasse estadual

Limpeza do terreno:

A Construtora deve proceder à limpeza do terreno destinado à construção, removendo qualquer detrito nele existente e procedendo, inclusive, o eventual deslocamento.

Locação:

Feita a limpeza do terreno, será realizada a locação da obra, que deverá obedecer rigorosamente às indicações do projeto arquitetônico executivo e sua implantação. A CONTRATADA deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados à perfeita locação, execução da obra e ou serviços e seu respectivo acompanhamento, e de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos.

5. MOVIMENTO DE TERRA

Será feito o movimento de terra necessário para se obter um perfil de superfície adequado à execução da obra, seguindo cotas e níveis conforme o constante no Projeto de Terraplenagem da edificação.


Jose Alcino Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



O aterro que se fizer necessário será executado com material escolhido e/ou previamente definido em projeto específico, e adequadamente compactado. Para tanto, observar o constante em norma para execução deste serviço.

Os aterros e ou reaterros em geral, serão executados com material de primeira categoria, em camadas de 20 em 20cm.

6. FUNDAÇÕES

As fundações serão executadas conforme o dimensionamento constante do Projeto de Fundações, observando a natureza do subsolo.

Onde não houver indicação de tratamento em projeto específico, paredes e muros de arrimo que recebem aterro encostado, deverão receber, na face externa sujeita a umidade, reboco impermeável.

Na concretagem dever-se-á adotar cuidados para que não haja segregação dos materiais, ou mistura com terra.

7. CONCRETO ARMADO

Os pilares, vigas e lajes serão executados em concreto armado, conforme Projeto Estrutural. As lajes deverão ser executadas conforme indicações de projeto.

A execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o projeto estrutural e ao disposto pela ABNT, nas normas específicas para cada tipo de estrutura projetada.

Os pilares, vigas e lajes serão executados em concreto armado, conforme definições do Projeto Estrutural para atendimento as cargas e as especificações da NBR 6118.

Existindo necessidade de furações em vigas ou lajes, para passagem de tubulações elétricas, hidráulicas, ou outra qualquer, a fiscalização deverá ser consultada, e esta encaminhará o assunto ao responsável técnico do projeto.

As lajes de cobertura expostas a intempéries deverão ser impermeabilizadas de forma a não apresentar infiltrações e vazamentos.

8. CONCRETO SIMPLES

A camada impermeabilizante de concreto simples deverá ser executada depois de estar o terreno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas as tubulações enterradas.

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



Deverão ser tomadas precauções não só na passagem da camada sobre tubulações, de maneira que não haja diminuição na espessura, como também na formação dos rodapés ao longo das paredes.

9. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria singelo:

Alvenaria singela devem ser feitas em blocos cerâmico furados. Estes devem sempre estar aprumados e nivelados com auxílios de linhas de nylon, durante toda a etapa de elevação, o prumo, o nível e o alinhamento devem ser verificados de maneira constante. A régua-prumo-nível agiliza e confere precisão a este procedimento

Chapisco:

Toda a alvenaria será chapiscada depois de convenientemente limpa e molhada. A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida, ser constituída de areia, predominantemente grossa.

Emboço:

O reboco só deve ser aplicado após a cura do chapisco. O reboco deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e deverá possuir textura e composição uniforme.

Pintura:

O processo de pintura só pode ser realizado após a limpeza de toda a superfície iniciando o processo com aplicação do selador acrílico e posteriormente a massa corrida.

Deve-se observa em projeto os tipos de tinta para cada ambiente.

10. ESQUADRIAS

Vergas:

Serão colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado, sobre os vãos de portas e janelas que não estejam imediatamente sob vigamento, com secção e armadura necessárias para vencer estes vãos.

Todos os vãos superiores a 50cm e com nível de peitoril acima do piso receberão uma segunda verga, imediatamente sob a abertura, excedendo no mínimo 30cm de cada lado

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



Portas:

As portas indicadas no projeto arquitetônico, com dimensões especificadas na planilha de esquadrias. Todas as peças das esquadrias de madeira serão imunizadas.

O produto deve apresentar superfície lisa, sem deformações e coloração homogênea, pronta para receber tinta. A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nível e o esquadro. Duas dobradiças deverão ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco.

Peitoril e Soleiras:

Os peitoris de janela e soleiras das portas serão em granito Branco Dallas polido com dimensões adequadas aos vãos e espessura de 2cm. Deverão ser previstas pingadeiras nos peitoris das janelas com vão para o exterior de prédio, conforme detalhe arquitetônico.

11. CALÇADA

Calçada:

Deverão ser feitas conforme definido na Implantação Arquitetônica e seguindo o especificado para o piso neste memorial.

As calçadas, junto às portas de acesso à edificação, deverão obedecer à inclinação prevista em projeto. Quando não indicado, adotar inclinação mínima de 2%, buscando evitar problemas com a entrada de água.

12. ELÉTRICA

As instalações serão executadas em conformidade com o projeto, e NBR vigente 5410 sendo executadas por profissionais com formação na área.

Toda a fiação elétrica, deve obedecer às bitolas descritas em projetos.

As fiações subterrâneas passarão em caixas de passagem instaladas no solo conforme projeto.

Os interruptores e tomadas deverão obedecer às especificações conforme norma brasileira específica e indicações presentes em projeto de rede elétrica. Os espelhos de acabamento devem cobrir perfeitamente a caixa de instalação, sem vãos aparentes. Quantidades e especificação estão presentes nos projetos específicos.

José Alcyr Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



13. COBERTURA

A cobertura deverá ser executada com telhas fibrocimento 6 mm, sobre estrutura de madeira existente, conforme orçamento e projeto. A cumeeira deverá ser em fibrocimento 6 mm. Incluso acessórios para fixação das telhas e da cumeeira em fibrocimento. No encaixe das telhas (rincão), deverá ser instalada calha em chapa de aço galvanizado.

O ângulo da cumeeira deverá coincidir com o ângulo do telhado.

Calha:

Os contra-rufos e calhas serão em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura, com dimensões de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de manutenção. Deverão possuir ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de água pluvial. Deverão atender a NBR 10844.

14. FORRO

Haverá forro em lambril de PVC, com largura 20cm. As peças serão fixadas com barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0 cm, colocados a cada 50 cm.

15. PISO

Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos, será executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante.

Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado E que todas as canalizações que devam passar sob o piso estejam colocadas.

Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, para o perfeito escoamento de água.

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com caimento para os ralos.

A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um acabamento sem depressões ou ondulações.

16. HIDRAULICA

Água fria:

O projeto de instalação de água fria foi elaborado seguindo as prescrições da NBR 5626/98 que estabelecem as exigências mínimas de segurança e economia.

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

Todo o projeto foi desenvolvido para tubos e conexões de PVC rígido da linha soldável.

As instalações de água fria devem obedecer os projetos assim como as normativas da ABNT.

Esgoto sanitário:

A rede de esgoto sanitário deve ser feita obedecendo seu respectivo projeto assim como as normativas da ABNT NBR 8160.

O projeto de esgoto sanitário foi elaborado de maneira a permitir o rápido escoamento dos despejos e fácil desobstrução das tubulações; não permitir vazamentos, escapamento de gases e formação de depósitos no interior das tubulações; vedar a passagem de gases e animais das tubulações para o interior das edificações.

Drenagem:

A rede de drenagem deve ser feita obedecendo seu respectivo projeto assim como as normativas da ABNT NBR 10840.

A ligação entre a calha e a parede deverá ser protegida com rufos de alumínio. Toda a platibanda deverá receber pingadeira a fim de evitar manchas provocadas pela água escorrendo na parede.

Observação geral:

Qualquer modificação no projeto arquitetônico, terá que ter previa aprovação do projetista. Todos os serviços e matérias empregados na obra deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este memorial descritivo, e não tiver a aprovação do responsável técnico, serão de inteira responsabilidade, da contratada (construtor), que desenvolver tal atividade considerada em desacordo.



JOSÉ ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA: 151525739-8

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFORNIA ITAITUBA-PARÁ

DATA DO ORÇAMENTO: 30/09/2020

TABELA
SINAPI/PA - 16/07/2020
COM DESONERAÇÃO
SEDOP ABRIL/2020

BDI: 29,90%

VALOR:
R\$102.886,98

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL C/BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.752,95
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP 11340	m²	6	160,83	208,92	1.253,52
1.2	Limpeza do terreno	SEDOP 10008	m²	96	1,72	2,23	214,08
1.3	Locação da obra a trena	SEDOP 10009	m²	51,6	4,26	5,53	285,35
2.0	MOVIMENTO DE TERRA						1.107,42
2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP 30010	m³	4,88	43,08	55,96	273,08
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	SEDOP 30011	m³	6,84	93,90	121,98	834,34
3.0	ESTRUTURAL						9.296,22
3.1	FUNDAÇÃO						4.285,45
3.1.1	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	SEDOP 40283	m³	0,32	2.189,68	2.844,39	910,20
3.1.2	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	SEDOP 40284	m³	1,26	2.062,18	2.678,77	3.375,25
3.2	ESTRUTURA						5.010,77
3.2.1	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca	SEDOP 50729	m³	1,54	2.359,68	3.065,22	4.720,44
3.2.2	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPa (incl. preparo e lançamento)	SEDOP 050258	m³	0,39	579,03	752,16	290,33
4	ALVENARIA						29.323,79
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	SEDOP 60046	m²	136,10	55,80	72,48	9.864,53

Assinatura

João Almir Oliveira da Silva Junior

Jose Alar Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ

DATA DO ORÇAMENTO: 30/09/2020

TABELA

SINAPI/PA - 16/07/2020

COM DESONERAÇÃO

SEDOP ABRIL/2020

BDI: 29,90%

VALOR:

R\$102.886,98

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNITARIO SEM BDI	UNITARIO COM BDI	TOTAL C/ BDI
4.2	Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP 60045	m²	19,53	75,45	98,01	1.914,14
4.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP 110143	m²	272,20	9,04	11,74	3.195,63
4.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP 110763	m²	272,20	36,69	47,66	12.973,05
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI 87273	m²	21,46	49,38	64,14	1.376,44
5	PINTURA	SEDOP 150730	M2	250,74	27,71	36,00	9.026,64
5.1	PVA interna c/ massa acrílica e selador	SEDOP 150377	M2	10,92	21,07	27,37	298,88
5.2	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa						12.107,82
6	COBERTURA	SEDOP 70054	M2	88,12	53,32	69,26	6.103,19
6.1	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada	SEDOP 071498	M2	88,12	44,44	57,73	5.087,17
6.2	Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm	SEDOP 070029	M	10,80	65,40	84,95	917,46
6.3	Cumeeira em fibrocimento e=6mm						7.572,41
7	PISO	SEDOP 130112	M2	51,00	52,20	67,81	3.458,31
7.1	Concreto simples c/ seio e=5cm traço 1:2:3	SEDOP 130110	M2	51,00	29,44	38,24	1.950,24
7.2	Camada regularizadora no traço 1:4	SINAPI 87251	M2	44,94	37,07	48,15	2.163,86
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014						

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior

1/27

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8

Alcir



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ

DATA DO ORÇAMENTO: 30/09/2020

TABELA
SINAPI/PA - 16/07/2020
COM DESONERAÇÃO
SEDOP ABRIL/2020

BDI: 29,90%

VALOR:
R\$102.886,98

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL C/ BDI
8	FORRO					4.184,36	
8.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	SEDOP 140348	M2	44,94	45,69	2.667,19	
8.2	Forro em lambri de PVC	SEDOP 141336	M2	44,94	25,99	1.517,17	
9	ESQUADRIA					10.021,59	
9.1	Porta em madeira lambrizada	SEDOP 090641	M2	10,92	339,10	440,49	
9.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	SEDOP 91511	M2	7,35	481,45	625,40	
9.3	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	SEDOP 120734	M2	0,97	487,88	614,75	
10	HIDROSSANITÁRIA					11.474,94	
10.1	ESGOTO					4.895,02	
10.1.1	Tubo em PVC - 100mm (LS)	SEDOP 180102	M	6,00	24,43	31,73	
10.1.2	Tubo em PVC - 75mm (LS)	SEDOP 180103	M	6,00	20,17	26,20	
10.1.3	Tubo em PVC - 50mm (LS)	SEDOP 180104	M	18,00	13,15	17,08	
10.1.4	Joelho 90º RC em PVC - JS - 75mm-LS	SEDOP 180473	UND	2,00	15,83	20,56	
10.1.5	Joelho 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS	SEDOP 180472	UND	6,00	14,78	19,20	
10.1.6	Tê em PVC - JS - 50x50mm-LS	SEDOP 180476	UND	1,00	16,47	21,39	

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



DIRETORIA TÉCNICA E FINANCEIRA			DATA DO ORÇAMENTO: 30/09/2020		BDI: 29,90%	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA			TABELA		VALOR:	
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE			SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020		R\$102.886,98	
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ						
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUB						

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ

DATA DO ORÇAMENTO: 30/09/2020

TABELA
SINAPI/PA - 16/07/2020
COM DESONERAÇÃO
SEDOP ABRIL/2020

BDI: 29,90%

VALOR:
R\$102.886,98

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL C/ BDI
10.2.5	Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH)	SEDOP 180230	und	4,00	4,52	5,87	23,48
10.2.6	Bucha de redução JS - 50mm x 32mm (LH)	SEDOP 180231	und	1,00	7,79	10,12	10,12
10.2.7	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI 89365	und	1,00	7,01	9,11	9,11
10.2.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI 89364	und	7,00	7,49	9,73	68,11
10.2.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI 89369	und	2,00	11,26	14,63	29,26
10.2.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI 89503	und	2,00	15,31	19,89	39,78
10.2.11	Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	SEDOP 180221	und	7,00	9,96	12,94	90,58
10.2.12	Registro de pressão c/ canopia - 3/4"	SEDOP 180446	und	1,00	65,70	85,34	85,34
10.2.13	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI 94490	und	1,00	22,68	29,46	29,46
10.2.14	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI 94492	und	1,00	32,25	41,89	41,89
10.2.15	Tê em PVC - JS - 25mm-LH	SEDOP 180434	und	3,00	7,11	9,24	27,72
10.2.16	Tê em PVC - JS - 32mm-LH	SEDOP 180435	und	4,00	9,43	12,25	49,00


Jose Alcir Oliveira da Silva Junior

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS





DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ

DATA DO ORÇAMENTO: 30/09/2020

TABELA
SINAPI/PA - 16/07/2020
COM DESONERAÇÃO
SEDOP ABRIL/2020

BDI: 29,90%

VALOR:
R\$102.886,98

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL C/BDI
10.2.17	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	SEDOP 180108	m	6,00	8,73	11,34	68,04
10.2.18	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	SEDOP 180107	m	18,00	9,92	12,89	232,02
10.2.19	Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	SEDOP 180106	m	15,00	16,38	21,28	319,20
10.2.20	Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	SEDOP 180423	m	6,00	22,82	29,64	177,84
10.2.21	Reservatório em polietileno de 500 L	SEDOP 180460	und	1,00	1.823,55	2.368,79	2.368,79
10.3	LOUÇAS E METAIS						2.848,99
10.3.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	SEDOP 190609	und	1,00	463,97	602,70	602,70
10.3.2	Chuveiro em PVC	SEDOP 190218	und	1,00	23,87	31,01	31,01
10.3.3	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	SEDOP 190232	und	3,00	387,89	503,87	1.511,61
10.3.4	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	SEDOP 190238	und	1,00	541,70	703,67	703,67
11	ELÉTRICA						6.719,96
11.1	Eletroduto PVC de 1 1/4"	SEDOP 170632	M	3,00	12,32	16,00	48,00
11.2	Eletroduto PVC de 1"	SEDOP 170078	M	122,67	9,64	12,52	1.535,83
11.3	Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE)	SEDOP 171267	UND	1,00	14,70	19,10	19,10
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI 91924	M	171,36	1,76	2,29	392,41

11.17

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739,8

[Assinatura]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ

DATA DO ORÇAMENTO: 30/09/2020

BDI: 29,90%

TABELA

SINAPI/PA - 16/07/2020
COM DESONERAÇÃO
SEDOP ABRIL/2020

VALOR:

R\$102.386,98

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO		
					UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL C/ BDI
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI 91926	M	148,20	2,52	3,27	484,61
11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI 91928	M	104,69	4,05	5,26	550,67
11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI 91927	M	7,19	9,07	11,78	84,70
11.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI 74130/001	UND	5,00	10,07	13,08	65,40
11.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI 74130/003	UND	5,00	44,70	58,07	290,35
11.10	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	SEDOP 171458	UND	5,00	103,88	134,94	674,70
11.11	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	SEDOP 170339	UND	8,00	16,39	21,29	170,32
11.12	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	SEDOP 171523	UND	3,00	20,71	26,90	80,70
11.13	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	SEDOP 171522	UND	6,00	29,37	38,15	228,90
11.14	Conjunto Airstop de embutir completo	SEDOP 231215	UND	4,00	57,78	75,06	300,24
11.15	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	SEDOP 170337	UND	2,00	24,01	31,19	62,38
11.16	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	SEDOP 170332	UND	6,00	12,77	16,59	99,54
11.17	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	SEDOP 170338	UND	1,00	30,35	39,42	39,42

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior

Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITATUBA			DATA DO ORÇAMENTO: 30/09/2020		BDI: 29,90%	
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE			TABELA SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020		VALOR:	
					R\$102.386,98	
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITATUBA-PARÁ						

Itaituba - Pa 30 de SETEMBRO de 2020


José Alcyr Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA.

Jose Alcyr Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/09/2020
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE	VALOR
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ	102.886,98

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS
				30	60	90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.752,95	1,70%	100,00%		
				R\$ 1.752,95		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.107,42	1,08%	100,00%		
				R\$ 1.107,42		
3.0	ESTRUTURAL	R\$ 9.296,22	9,04%	100,00%		
				R\$ 9.296,22		
4.0	ALVENARIA	R\$ 29.323,79	28,50%	100,00%		
				R\$ 29.323,79		
5.0	PINTURA	R\$ 9.325,52	9,06%			100,00%
						R\$ 9.325,52
6.0	COBERTURA	R\$ 12.107,82	11,77%	50,00%	50,00%	
				R\$ 6.053,91	R\$ 6.053,91	
7.0	PISO	R\$ 7.572,41	7,36%		100,00%	
					R\$ 7.572,41	
8.0	FORRO	R\$ 4.184,36	4,07%		100,00%	
					R\$ 4.184,36	
9.0	ESQUADRIA	R\$ 10.021,59	9,74%			100,00%
						R\$ 10.021,59
10.0	HIDROSSANITÁRIA	R\$ 11.474,94	11,15%		50,00%	50,00%
					R\$ 5.737,47	R\$ 5.737,47
11	ELÉTRICA	R\$ 6.719,96	6,53%		50,00%	50,00%
					R\$ 3.359,98	R\$ 3.359,98
TOTAL		R\$ 102.886,98	100,00%			
PARCIAL SIMPLES R\$				R\$ 47.534,29	R\$ 26.908,13	R\$ 28.444,56
PERCENTUAIS SIMPLES %				46,20%	26,15%	27,65%
PARCIAIS ACUMULADOS R\$				R\$ 47.534,29	R\$ 74.442,42	R\$ 102.886,98
PERCENTUAIS ACUMULADOS %				46,20%	72,35%	100,00%

Itaituba - Pa 30 de SETEMBRO de 2020


José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA			DATA DA EXPEDIÇÃO:		30/09/2020	
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE			VALOR DA OBRA:	R\$	102.886,98	
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ		BDI (29,90%)	TABELA SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020			
1.1 11340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica - m²						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00475	Lona com plotagem de gráfica	SEDOP	M2	1,0000000	87,50	87,5
D00281	Pernamancia 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	Dz	0,4100000	145,00	59,45
D00084	Prego 1 1/2"x13	SEDOP	KG	0,1000000	9,55	0,96
88261	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,4000000	17,94	7,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,4000000	14,36	5,74
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	160,83
1.2 10008 - Limpeza do terreno - m²						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,1200000	14,36	1,72
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	1,72
1.3 10009 - Locação da obra a trena - M²						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00081	Prego 2 1/2"x10	SEDOP	KG	0,003000	8,38	0,03
D00043	Arame recozido No. 18	SEDOP	KG	0,002000	8,50	0,02
D00281	Pernamancia 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	DZ	0,010000	145,00	1,45
D00016	Tábua de madeira branca 4m	SEDOP	DZ	0,010000	70,00	0,70
D00238	Linha de nylon no. 80	SEDOP	RI	0,010000	7,98	0,08
88261	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,070000	17,94	1,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,050000	14,36	0,72
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	4,26
2.1 30010 - Escavação manual ate 1.50m de profundidade - m³						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	3,000000	14,36	43,08
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	43,08
2.2 30011 - Aterro c/ material fora da obra, incl. Apiloamento - m³						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M00006	Compactador de solo CM-13	SEDOP	HP	0,300000	11,06	3,32
J00001	Aterro arenoso	SEDOP	M3	1,250000	38,00	47,5
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	3,000000	14,36	43,08
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	93,90
3.1.1 40283 - Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma) - M³						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50036	Forma c/ madeira branca	SEDOP	M2	12,000000	84,76	1017,12
50037	Desforma	SEDOP	M2	12,000000	4,31	51,72
50038	Armação p/ concreto	SEDOP	KG	60,000000	8,50	510
50259	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento)	SEDOP	M3	1,000000	610,84	610,84
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	2189,68
3.1.2 40284 - Baldrame em concreto armado c/ dnta de amarração - M³						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50036	Forma c/ madeira branca	SEDOP	M2	12,000000	84,76	1017,12
50037	Desforma	SEDOP	M2	12,000000	4,31	51,72
50038	Armação p/ concreto	SEDOP	KG	45,000000	8,50	382,5
50259	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento)	SEDOP	M3	1,000000	610,84	610,84
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	2062,18
3.2.1 50729 - Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. Branca - M³						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
50036	Forma c/ madeira branca	SEDOP	M2	12,000000	84,76	1017,12
50037	Desforma	SEDOP	M2	12,000000	4,31	51,72
50038	Armação p/ concreto	SEDOP	KG	80,000000	8,50	680
50259	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento)	SEDOP	M3	1,000000	610,84	610,84
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	2359,68
3.2.2 50258 - Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lançamento) - M³						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J00005	Areia	SEDOP	M3	0,840000	52,58	44,17
M00008	Betoneira eletrica - 320l	SEDOP	H	0,720000	4,07	2,93

Alcyr

Jose Alcyr Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA				DATA DA EXPEDIÇÃO:		30/09/2020
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE				VALOR DA OBRA:	R\$	102.886,98
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ				BDI (29,90%)	TABELA SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020	
J00003	Cimento	SEDOP	SC	6,750000	34,5	232,88
J00007	Seixo lavado	SEDOP	M3	0,890000	112,5	100,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	5,000000	18,03	90,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	8,000000	14,36	114,88
88377	OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,500000	17,13	25,7
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						610,84
4.1 60046 - Alvenaria tijolo de barro a cutelo - M²						
MATERIAL						
D00036	Tijolo de barro 14x19x9	SEDOP	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110764	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6	SEDOP	M3	0,02000	339,61	6,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,00000	18,03	18,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,50000	14,36	7,18
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						55,80
4.2 60045 - Alvenaria tijolo de barro a singelo - M²						
MATERIAL						
D00036	Tijolo de barro 14x19x9	SEDOP	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110764	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6	SEDOP	M3	0,03000	339,61	10,19
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,20000	18,03	21,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,60000	14,36	8,62
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						75,45
4.3 110143 - Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 - M²						
MATERIAL						
110248	Argamassa de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	M3	0,003000	529,19	1,59
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,230000	18,03	4,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,230000	14,36	3,3
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						9,04
4.4 110763 - Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. - M²						
MATERIAL						
110764	Argamassa de cimento e areia no traço 1:6	SEDOP	M3	0,025	339,61	8,49
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,87	14,38	12,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,87	18,03	15,69
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						36,69
4.5 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - M²						
MATERIAL						
536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,0800000	24,90	26,89
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,1400000	0,64	3,92
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,2200000	3,75	0,82
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,6600000	19,08	12,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3600000	14,36	5,16
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						49,38
5.1 150730 - PVA interna c/ massa acrílica e selador - m²						
MATERIAL						
P00007	Lixa para parede	SEDOP	UM	0,65	0,75	0,49
P00022	Massa acrílica	SEDOP	GL	0,07	38,50	2,70
P00002	Tinta latex interior	SEDOP	GL	0,05	45,20	2,26
P00008	Líquido selador p/ parede	SEDOP	GL	0,03	32,00	0,96
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,7	19,14	13,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,55	14,36	7,90
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						27,71
5.2 150377 - Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa - m²						
MATERIAL						
P00019	Tinta esmalte	SEDOP	GL	0,040000	85,00	3,40
P00027	Aguarras	SEDOP	GL	0,010000	46,08	0,46
P00014	Lixa para madeira	SEDOP	UNID	0,400000	1,00	0,40
P0030	Líquido selador p/madeira	SEDOP	GL	0,040000	103,00	4,12
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,400000	19,14	7,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,350000	14,36	5,03
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						21,07
6.1 - 70054 - Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. Serrada - m²						
MATERIAL						

Assinatura

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA				DATA DA EXPEDIÇÃO:		30/09/2020
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE				VALOR DA OBRA:	R\$	102.886,98
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ				BDI (29,90%)	TABELA SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020	
D00082	Prego 2"x11	SEDOP	KG	0,07000	8,34	0,58
D00012	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	SEDOP	DZ	0,05100	144,00	7,34
D00010	Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte	SEDOP	DZ	0,03000	340,00	10,2
D00006	Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr.	SEDOP	UNID	0,00900	102,00	0,92
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,05000	14,70	15,44
88261	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,05000	17,94	18,84
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						53,32
6.2 71498 - Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm - M²						
MATERIAL						
D00344	Arruela concava em PVC d=5/16"	SEDOP	UNID	1,40000	0,49	0,69
D00209	Gancho chato p/ telha fibrocimento	SEDOP	UNID	1,40000	1,89	2,65
D00429	Telha Brasilit ondulada (2,44x0,50) e=4mm	SEDOP	UNID	0,83000	28,00	23,24
D00001	Parafuso fo go 5/16" c= 110mm	SEDOP	UNID	1,40000	1,16	1,62
D00002	Massa de vedação	SEDOP	KG	0,01000	12,30	0,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,50000	14,36	7,18
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,50000	17,88	8,94
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						44,44
6.3 70029 - Cumeeira em fibrocimento e=6mm - M						
MATERIAL						
D00344	Arruela concava em PVC d=5/16"	SEDOP	UNID	1,0000	0,49	0,49
D00001	Parafuso fo go 5/16" c= 110mm	SEDOP	UNID	1,0000	1,16	1,16
D00176	Cumeeira normal em fibrocimento 6mm	SEDOP	UNID	1,0000	58,92	58,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,1500	14,36	2,15
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,1500	17,88	2,68
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						65,40
7.1 130112 - Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 - M³						
MATERIAL						
J00003	CIMENTO	SEDOP	SC	0,350000	34,50	12,08
J00007	SEIXO LAVADO	SEDOP	M3	0,050000	112,50	5,63
J00005	Areia	SEDOP	M3	0,040000	52,58	2,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,000000	18,03	18,03
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,000000	14,36	14,36
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						52,20
7.2 130110 - Camada regularizadora no traço 1:4 - M²						
MATERIAL						
J00003	CIMENTO	SEDOP	SC	0,150000	34,50	5,18
J00005	Areia	SEDOP	M3	0,037000	52,58	1,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,600000	18,03	10,82
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,800000	14,36	11,49
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						29,44
7.3 87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 - M²						
MATERIAL						
1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,0600000	23,90	25,33
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,1400000	0,64	3,92
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,1900000	3,75	0,71
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2600000	19,08	4,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1500000	14,36	2,15
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						37,07
8.1 140348 - Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC - m²						
MATERIAL						
D00084	Prego 1 1/2"x13	SEDOP	KG	0,20000	9,55	1,91
D00012	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	SEDOP	DZ	0,10000	144,00	14,40
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,90000	14,70	13,23
88261	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,90000	17,94	16,15
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						45,69
8.2 141336 - Forro em lambri de PVC - M²						
MATERIAL						
A00024	Forro em lambri de PVC	SEDOP	M2	1,0000	16,20	16,20
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,3000	14,70	4,41
88261	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,3000	17,94	5,38
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI						25,99
9.1 90641 - Porta em madeira lambrizada - M²						
MATERIAL						
D00283	Caixa p/ esquadria madeira lambrizada	SEDOP	M2	0,68000	190,00	129,20

Handwritten signature

Jose Alcyr Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 45425720-0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA					DATA DA EXPEDIÇÃO:		30/09/2020
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE					VALOR DA OBRA:	R\$	102.886,98
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ					BDI (29,90%)	TABELA SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020	
D00282	Porta em madeira lambrizada	SEDOP	M2	1,00000	116,88	116,88	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,20000	14,70	17,64	
88261	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	3,90000	17,94	69,97	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,30000	18,03	5,41	
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI							339,10
9.2 91511 - Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm - m²							
MATERIAL							
D00350	Vidro temperado incolor e=6mm	SEDOP	M2	1,05000	270,00	283,50	
D00473	Ferragens para esquadria de correr	SEDOP	CJ	1,00000	107,21	107,21	
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	H	2,80000	14,38	40,26	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	2,80000	18,03	50,48	
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI							481,45
9.3 120734 - Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm - m²							
MATERIAL							
D00345	Argamassa AC-III	SEDOP	KG	1,0000	1,92	1,92	
A00053	Granito p/ soleira/peitoril e=2cm	SEDOP	M2	1,0000	450,00	450,00	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,8000	18,03	14,42	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1,5000	14,36	21,54	
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI							487,88
10.1.1 180102 - Tubo em PVC - 100mm (LS) - M							
MATERIAL							
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,01000	37,25	0,37	
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,18000	5,92	1,07	
H00001	Tubo em PVC - 100mm (LS)	SEDOP	M2	1,05000	8,35	8,77	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,45000	14,01	6,30	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,45000	17,61	7,92	
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI							24,43
10.1.2 180103 - Tubo em PVC - 75mm (LS) - M							
MATERIAL							
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,00500	37,25	0,19	
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,15000	5,92	0,89	
H00002	Tubo em PVC - 75mm (LS)	SEDOP	M2	1,05000	8,35	9,61	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,30000	14,01	4,20	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,30000	17,61	5,28	
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI							20,17
10.1.3 180104 - Tubo em PVC - 50mm (LS) - M							
MATERIAL							
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,00300	37,25	0,11	
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,11000	5,92	0,65	
H00003	Tubo em PVC - 50mm (LS)	SEDOP	M2	1,05000	8,35	6,07	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,20000	14,01	2,80	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,20000	17,61	3,52	
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI							13,15
10.1.4 180473 - Joelho 90° RC em PVC - JS - 75mm-LS - UND							
MATERIAL							
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,003500	37,25	0,13	
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,100000	5,92	0,59	
H00153	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 75mm-LS	SEDOP	UND	1,000000	3,73	3,73	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,360000	14,01	5,04	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,360000	17,61	6,34	
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI							15,83
10.1.5 180472 - Joelho 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS - UND							
MATERIAL							
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,00200	37,25	0,07	
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,06100	5,92	0,36	
H00105	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	SEDOP	UND	1,00000	5,50	5,50	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,28000	14,01	3,92	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,28000	17,61	4,93	
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI							14,78
10.1.6 180476 - Tê em PVC - JS - 50x50mm-LS - und							
MATERIAL							
H00212	Te curto em PVC - JS - 50x50mm (LS)	SEDOP	UND	1,00000	5,9	5,9	
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,00600	37,25	0,22	

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA				DATA DA EXPEDIÇÃO:		30/09/2020
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE				VALOR DA OBRA:	R\$	102.886,98
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ				BDI (29,90%)	TABELA SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020	
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,20000	5,92	1,18
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,29000	14,01	4,06
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,29000	17,61	5,11
10.1.7 180255 - Redução PVC 75mm x 50mm - LS - und					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	16,47
MATERIAL						
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,037000	37,25	1,38
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	1,000000	5,92	0,59
H00340	Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS	SEDOP	UND	1,000000	5,50	5,50
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,360000	14,01	5,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,360000	17,61	6,34
10.1.8 180093 - Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm - und					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	18,85
MATERIAL						
H0008	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	SEDOP	UND	1,000000	10,99	10,99
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,110000	14,01	1,54
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,110000	17,61	1,94
10.1.9 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - und					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	14,47
MATERIAL						
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,0000000	2,90	2,9
1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,0000000	12,55	12,55
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,0460000	17,03	0,78
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1200000	13,80	1,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1200000	17,60	2,11
10.1.10 89803 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - UND					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	19,99
MATERIAL						
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,0000000	1,64	1,64
1932	CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,0000000	5,57	5,57
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,0200000	17,03	0,34
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0400000	13,80	0,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0400000	17,60	0,7
10.1.11 180243 - Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS - UND					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	8,80
MATERIAL						
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,02200	37,25	0,82
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,06100	5,92	0,36
H00328	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS	SEDOP	UND	1,00000	5,00	5,00
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,28000	14,01	3,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,28000	17,61	4,93
10.1.12 180679 - Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto - UND					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	15,03
MATERIAL						
30010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP	M3	0,4000	43,08	17,23
40257	Lastro de concreto magro c/ seixo	SEDOP	M3	0,0320	511,61	16,37
50681	Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca	SEDOP	M3	0,0450	2327,87	104,75
60045	Alvenaria tijolo de barro a singelo	SEDOP	M2	1,3000	75,45	98,09
110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	SEDOP	M2	1,3900	9,04	12,57
110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	SEDOP	M2	1,3900	36,69	51,00

Alcyr

Jose Alcyr Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA				DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/09/2020		
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE			VALOR DA OBRA:	R\$ 102.886,98		
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ			BDI (29,90%)	TABELA SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020		
130113	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	SEDOP	M2	0,2500	40,45	10,11
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	310,12
10.1.13 180350 - Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas - UND						
MATERIAL						
H00062	Sumidouro cap=10 pessoas	SEDOP	UND	1,0000	739,89	739,89
20174	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	SEDOP	M3	1,9600	89,36	175,15
30010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP	M3	2,8000	43,08	120,62
30254	Reaterro compactado	SEDOP	M3	0,8400	46,4	38,98
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	H	2,5000	14,38	35,95
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	2,5000	18,03	45,08
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	1155,67
10.1.14 180349 - Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas - UND						
MATERIAL						
H00061	Fossa septica cap= 10 pessoas	SEDOP	UND	1,00000	544,29	544,29
20174	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	SEDOP	M3	3,36000	89,36	300,25
30010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP	M3	4,80000	43,08	206,78
30254	Reaterro compactado	SEDOP	M3	1,44000	46,40	66,82
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	SEDOP	H	4,00000	14,38	57,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	4,00000	18,03	72,12
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	1247,78
10.2.1 180239 - Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) - und						
MATERIAL						
H00367	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	SEDOP	UND	1,00000	0,65	0,65
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,00300	37,25	0,11
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,02000	5,92	0,12
H00055	Fita de vedacao	SEDOP	M	0,60000	0,18	0,11
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,09000	14,01	1,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,09000	17,61	1,58
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	3,83
10.2.2 180237 - Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) - und						
MATERIAL						
H00365	Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH)	SEDOP	UND	1,00000	1,70	1,70
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,00550	37,25	0,20
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,04400	5,92	0,26
H00055	Fita de vedacao	SEDOP	M	1,00000	0,18	0,18
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,09000	14,01	1,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,09000	17,61	1,58
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	5,18
10.2.3 180236 - Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) - und						
MATERIAL						
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,01100	37,25	0,41
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,09400	5,92	0,56
H00364	Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	SEDOP	und	1,00000	4,00	4,00
H00055	Fita de vedacao	SEDOP	M	1,57000	0,18	0,28
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,14000	14,01	1,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,14000	17,61	2,47
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	9,68
10.2.4 181513 - Bucha de redução JS 25x20mm (LH) - und						
MATERIAL						
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,01000	37,25	0,37
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,08000	5,92	0,47
H00428	Bucha de redução JS 25x20mm (LH)	SEDOP	und	1,00000	0,50	0,50
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,08000	14,01	1,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,08000	17,61	1,41
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	3,87
10.2.5 180230 - Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) - und						
MATERIAL						
H00358	Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH)	SEDOP	UND	1,00000	0,80	0,80
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,01100	37,25	0,41
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,08000	5,92	0,47
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,09000	14,01	1,26

Alcir

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/09/2020

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE VALOR DA OBRA: R\$ 102.886,98

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ BDI (29,90%) TABELA SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SEDOP H 0,09000 14,01 1,58
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,52

10.2.6 180231 - Bucha de redução JS - 50mm x 32mm (LH) - und

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00359 Bucha de redução JS - 50mm x 32mm (LH)	SEDOP	UND	1,00000	1,90	1,90
D00222 Solução limpadora	SEDOP	L	0,02000	37,25	0,75
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,12000	5,92	0,71
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,14000	14,01	1,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,14000	17,61	2,47

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,79

10.2.7 89365 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - und

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,0070000	46,52	0,32
1927 CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,0000000	1,59	1,59
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0080000	40,40	0,32
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0500000	1,51	0,07
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1500000	13,80	2,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1500000	17,60	2,64

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,01

10.2.8 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - und

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,0070000	46,52	0,32
1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,0000000	2,07	2,07
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0080000	40,40	0,32
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0500000	1,51	0,07
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1500000	13,80	2,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1500000	17,60	2,64

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,49

10.2.9 89369 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - UND

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,0090000	46,52	0,41
1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,0000000	4,70	4,7
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0110000	40,40	0,44
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0600000	1,51	0,09
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1790000	13,80	2,47
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1790000	17,60	3,15

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 11,26

10.2.10 89503 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - und

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,0180000	46,52	0,83
1959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,0000000	10,18	10,18
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0220000	40,40	0,88
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0240000	1,51	0,03
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1080000	13,80	1,49
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1080000	17,60	1,9

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 15,31

10.2.11 180221 - Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) - und

[Handwritten signature]

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA			DATA DA EXPEDIÇÃO:		30/09/2020
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE			VALOR DA OBRA:	R\$	102.886,98
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ			BDI (29,90%)	TABELA SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00222 Solução limpadora	SEDOP	L	0,00200	37,25	0,07
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,07000	5,92	0,41
H00349 Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	SEDOP	CHP	1,00000	3,79	3,79
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,18000	14,01	2,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,18000	17,61	3,17

10.2.12 180446 - Registro de pressão c/ canopla - 3/4" - und TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,96

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00055 Fita de vedação	SEDOP	M	0,7000	0,18	0,13
H00168 Registro de pressão c/ canopla - 3/4"	SEDOP	UND	1,0000	48,49	48,49
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,5400	14,01	7,57
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,5400	17,61	9,51

10.2.13 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 - und TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 65,70

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,0000000	16,23	16,23
20080 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,0600000	14,76	0,88
20083 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0140000	40,40	0,56
38383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0240000	1,51	0,03
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1590000	13,80	2,19
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1590000	17,60	2,79

10.2.14 94492 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2 - und TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 22,68

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11677 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,0000000	22,42	22,42
20080 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,1070000	14,76	1,57
20083 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,0270000	40,40	1,09
38383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,0340000	1,51	0,05
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2270000	13,80	3,13
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2270000	17,60	3,99

10.2.15 180434 - Tê em PVC - JS - 25mm-LH - UND TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 32,25

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00222 Solução limpadora	SEDOP	L	0,00400	37,25	0,15
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,01100	5,92	0,07
H00116 Tê em PVC - JS - 25mm-LH	SEDOP	UND	1,00000	1,20	1,20
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,18000	14,01	2,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,18000	17,61	3,17

10.2.16 180435 - Tê em PVC - JS - 32mm-LH - UND TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7,11

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00117 Tê em PVC - JS - 32mm	SEDOP	UND	1,00000	3,20	3,20
D00222 Solução limpadora	SEDOP	L	0,00400	37,25	0,15
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,01100	5,92	0,07
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,19000	14,01	2,66
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,19000	17,61	3,35

10.2.17 180108 - Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,43

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00222 Solução limpadora	SEDOP	L	0,000300	37,25	0,01
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,005000	5,92	0,03
H00007 Tubo em PVC - JS - 20mm -LH	SEDOP	M	1,010000	2,25	2,27
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,270000	14,01	3,78

Alcior

Jose Alcior Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - DA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA				DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/09/2020		
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE			VALOR DA OBRA:	R\$ 102.886,98		
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ			BDI (29,90%)	TABELA SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,150000	17,61	2,64
10.2.18 180107 - Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 8,73	
MATERIAL						
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,000300	37,25	0,01
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,007000	5,92	0,04
H00006	Tubo em PVC - JS - 25mm - LH	SEDOP	M	1,010000	2,48	2,50
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,300000	14,01	4,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,180000	17,61	3,17
10.2.19 180106 - Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,92	
MATERIAL						
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,000300	37,25	0,01
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,009000	5,92	0,05
H00005	Tubo em PVC - JS - 32mm - LH	SEDOP	M	1,010000	6,50	6,57
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,420000	14,01	5,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,220000	17,61	3,87
10.2.20 180423 - Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH - M					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 16,38	
MATERIAL						
H00157	Tubo em PVC - JS - 50mm (LH)	SEDOP	M	1,010000	10,00	10,10
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,000500	37,25	0,02
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,016000	5,92	0,09
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,510000	14,01	7,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,310000	17,61	5,46
10.2.21 - 180460 - Reservatório em polietileno de 500 L - UND					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 22,82	
MATERIAL						
H00186	Flange de aço galvanizado - 50mm	SEDOP	UND	4,000000	28,53	114,12
H00184	Flange de aço galvanizado - 20mm	SEDOP	UND	2,000000	9,92	19,84
H00182	Reservatório em polietileno de 500 L	SEDOP	UND	1,000000	222,23	222,23
D00224	Viga de peroba 6x16cm	SEDOP	M	5,000000	237,35	1186,75
H00185	Flange de aço galvanizado - 25mm	SEDOP	UND	2,000000	13,55	27,10
H00055	Fita de vedação	SEDOP	M	3,030000	0,18	0,55
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	8,000000	14,01	112,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	8,000000	17,61	140,88
10.3.1 190609 - Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento - UND					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1823,55	
MATERIAL						
D00222	Solução limpadora	SEDOP	L	0,000300	37,25	0,01
D00223	Adesivo p/ PVC - 75g	SEDOP	TB	0,009000	5,92	0,05
H00042	Parafuso niquelado para loucas sanitarias	SEDOP	UND	2,000000	3,07	6,14
H00022	Assento plastico	SEDOP	UND	1,000000	26,50	26,50
H00263	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada	SEDOP	UND	1,000000	266,63	266,63
H00025	Tubo de ligacao em PVC c/ canopia (LS)	SEDOP	UND	1,000000	28,30	28,30
H00023	Bolsa plastica (vaso sanitario)	SEDOP	UND	1,000000	2,34	2,34
H00024	Anel de borracha de 1"	SEDOP	UND	1,000000	1,20	1,20
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	4,200000	14,01	58,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	4,200000	17,61	73,96
10.3.2 190218 - Chuveiro em PVC - UND					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 463,97	
MATERIAL						
H00055	Fita de vedacao	SEDOP	M	0,280000	0,18	0,05
H00043	Chuveiro em PVC	SEDOP	UND	1,000000	8,00	8,00
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	0,500000	14,01	7,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,500000	17,61	8,81
10.3.3 190232 - Lavatorio de louca s/col.c/torn.,sifao e valv. - UND					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 951,81	

[Assinatura]

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA		DATA DA EXPEDIÇÃO:	30/09/2020
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE		VALOR DA OBRA:	R\$ 102.886,98

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ	BDI (29,90%)	TABELA SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020
--	--------------	--

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00032 Sifão metálico de 1 1/2"	SEDOP	UND	1,00000	130,96	130,96
H00042 Parafuso niquelado para louças sanitárias	SEDOP	UND	2,00000	3,07	6,14
H00056 Torneira metálica p/ lavatório de 1/2"	SEDOP	UND	1,00000	67,00	67,00
H00055 Fita de vedação	SEDOP	M	2,88000	0,18	0,52
H00046 Ligação flexível (engate) plástico	SEDOP	UND	1,00000	5,00	5,00
H00052 Lavatório de louça s/coluna branco (medio)	SEDOP	UND	1,00000	65,26	65,26
H00028 Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada	SEDOP	UND	1,00000	26,05	26,05
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	2,75000	14,01	38,53
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	2,75000	17,61	48,43
10.3.4 190238 - Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifão e valv.(1,50m) - UND					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 387,89

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00020 Valvula p/ pia d = 2" - inox	SEDOP	UND	1,00000	35,58	35,58
H00016 Sifão metálico de 2"	SEDOP	UND	1,00000	132,56	132,56
H00019 Torneira longa metálica de 3/4"	SEDOP	UND	1,00000	40,00	40,00
H00018 Pia de aço inoxidável c/ 01 cuba de 1,50m	SEDOP	UND	1,00000	222,43	222,43
H00055 Fita de vedação	SEDOP	M	2,50000	0,18	0,45
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDOP	H	3,50000	14,01	49,04
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDOP	H	3,50000	17,61	61,64
11.1 170632 - Eletroduto PVC de 1 1/4" - und					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 541,70

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E00295 Eletroduto em PVC de 1 1/4"	SEDOP	M	1,00000	5,70	5,70
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,13000	14,54	1,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,26000	18,18	4,73
11.2 170078 - Eletroduto PVC de 1" - M					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 12,32

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E00015 Eletroduto em PVC de 1	SEDOP	M	1,00000	4,04	4,04
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,11000	14,54	1,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,22000	18,18	4,00
11.3 171267 - Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) - und					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 9,64

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E00527 Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE)	SEDOP	UND	1,00000	4,52	4,52
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,20000	14,54	2,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,40000	18,18	7,27
11.4 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 14,70

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1013 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,1900000	0,81	0,96
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,0090000	3,42	0,03
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0240000	14,28	0,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0240000	18,19	0,43
11.5 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 1,76

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1014 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,1900000	1,29	1,53
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,0090000	3,42	0,03
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0300000	14,28	0,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0300000	18,19	0,54
					TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2,52

Alcyr

José Alcyr Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA		DATA DA EXPEDIÇÃO: 30/09/2020	
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE		VALOR DA OBRA:	R\$ 102.886,98
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ		BDI (29,90%)	TABELA SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020

11.6 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
981 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,1900000	2,30	2,73	
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,0090000	3,42	0,03	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0400000	14,28	0,57	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0400000	18,19	0,72	
				TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	4,05	

11.7 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - m						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1022 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,1900000	1,91	2,27	
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,0090000	3,42	0,03	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0300000	14,28	0,42	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0300000	18,19	0,54	
				TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	3,26	

11.8 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - und						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,0000000	7,80	7,8	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1250000	18,19	2,27	
				TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	10,07	

11.9 74130/003 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - und						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	SINAPI	UN	1,0000000	41,98	41,98	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1500000	18,19	2,72	
				TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	44,70	

11.10 171468 - Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P - und						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
E00761 Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	SEDOP	UND	1,00000	94,07	94,07	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,30000	14,54	4,36	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,30000	18,18	5,45	
				TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	103,88	

11.11 170339 - Tomada 2P+T 10A (s/fiação) - und						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
e00065 Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	SEDOP	UND	1,00000	6,90	6,90	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,29000	14,54	4,22	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,29000	18,18	5,27	
				TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	16,39	

11.12 171523 - Tomada 2P+T 20A (s/fiação) - und						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
E00768 Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	SEDOP	UND	1,00000	8,60	8,60	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,37000	14,54	5,38	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,37000	18,18	6,73	
				TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	20,71	

11.13 171522 - Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) - und						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
E00767 Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	SEDOP	UND	1,00000	14,65	14,65	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,45000	14,54	6,54	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,45000	18,18	8,18	
				TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	29,37	

11.14 231215 - Conjunto Airstop de embutir completo - und						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
E00708 Conjunto Airstop de embutir completa	SEDOP	UND	1,000000	45,05	45,05	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0,250000	14,54	3,64	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,500000	18,18	9,09	
				TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI	57,78	

11.15 170337 - Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação) - und						
--	--	--	--	--	--	--

Assinatura

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA				DATA DA EXPEDIÇÃO:		30/09/2020	
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE				VALOR DA OBRA:		R\$ 102.886,98	
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ				BDI (29,90%)		TABELA SINAPI/PA - 16/07/2020 COM DESONERAÇÃO SEDOP ABRIL/2020	
MATERIAL							
E00063	Interruptor 1 tecla e 1 tomada 10A - 250V	SEDOP	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,000000	11,90	11,90	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,370000	14,54	5,38	
						18,18	6,73
11.16 170332- Interruptor 1 tecla simples (s/fiação) - und						TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 24,01	
MATERIAL							
E00023	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	SEDOP	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,000000	5,90	5,90	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,210000	14,54	3,05	
						18,18	3,82
11.17 170338 - Interruptor 3 teclas simples (s/fiação) - und						TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 12,77	
MATERIAL							
E00064	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	SEDOP	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,000000	13,00	13,00	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,530000	14,54	7,71	
						18,18	9,64
11.18 170514 - Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 15W (sem fiação) - und						TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 30,35	
MATERIAL							
E00028	Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 15W (sem fiação)	SEDOP	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,000000	36	36,00	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,800000	14,54	11,63	
						18,18	14,54
11.19 170515 - Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 25W (sem fiação) - und						TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 62,17	
MATERIAL							
E00066	Luminária completa c/lâmp.fluor.1x32W - FCB	SEDOP	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,000000	40,91	40,91	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,800000	14,54	11,63	
						18,18	14,54
11.20 170984 - Luminária tipo arandela p/ lâmp fluorescente - und						TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 67,08	
MATERIAL							
E00601	Luminária tipo arandela p/ lâmp incandescente	SEDOP	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,000000	26,32	26,32	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,750000	14,54	10,91	
						18,18	27,27
11.21 170999 - Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)25W -127V/220V - und						TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 64,50	
MATERIAL							
E00575	Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)20W	SEDOP	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,000000	12,61	12,61	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,100000	14,54	1,45	
						18,18	3,64
11.22 171417 - Caixa plástica octogonal - und						TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 17,70	
MATERIAL							
E00758	Caixa plástica octogonal	SEDOP	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,000000	5,00	5,00	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,020000	14,54	0,29	
						18,18	0,73
11.23 170881 - Caixa plástica 4"x2" - und						TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 6,02	
MATERIAL							
E00444	Caixa plástica 4"x2"	SEDOP	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,000000	1,50	1,50	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,020000	14,54	0,29	
						18,18	0,73
11.24 - 170321 - Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento) - und						TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2,52	
MATERIAL							
E00044	Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento	SEDOP	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	1,0000	258,07	258,07	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	2,0000	14,54	29,08	
						18,18	36,36
						TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 323,51	

Alcir
JOSÉ ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA 151525739-8 PA

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ

DATA:

30/09/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CÁLCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m ²	6	2,00 X 3,00 = 6 M ²
1.2	Limpeza do terreno	m ²	96	12,00 X 8,00 = 96 M ²
1.3	Locação da obra a trena	m ²	51,6	5,16 X 10,00 = 51,60 M ²
2.0	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m ³	4,88	55,80 X 0,35 X 0,25 = 4,88 M ³
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m ³	6,84	45,64 X 0,15 = 6,84 M ³
3.0	ESTRUTURAL			
3.1	FUNDAÇÃO			
3.1.1	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m ³	0,32	RI OCO: 0,40 X 0,40 X 0,20 X 10 = 0,32 M ³
3.1.2	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m ³	1,26	VIGA BALDRAME: 55,80 X 0,15 X 0,15 = 1,26 M ³
3.2	ESTRUTURA			
3.2.1	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca	m ³	1,54	PILARES: 0,10 X 0,20 X 3,50 X 10 = 0,70 M ³ CINTA: 55,80 X 0,10 X 0,15 = 0,84 M ³
3.2.2	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPa (incl. preparo e lançamento)	m ³	0,39	VERGAS E CONTRA VERGAS: 38,60 X 0,10 X 0,10 = 0,39M ³
4	ALVENARIA			
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m ²	136,10	50 X 3,00 = 150,00 M ² + 4,40 M ² = 154,40 M ² - VÃOS 18,30 = 136,10 M ²
4.2	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m ²	19,53	BALDRAMDE: 55,80 X 0,35 = 19,53 M ²
4.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m ²	272,20	136,10 X 2 = 272,20 M ²
4.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m ²	272,20	136,10 X 2 = 272,20 M ²
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m ²	21,46	BANHEIRO: (2,40 X 2,90 X 2) + (1,30 X 2,90 X 2) = 21,46 M ²
5	PINTURA			
5.1	PVA interna c/ massa acrílica e selador	M2	250,74	272,20 - 21,46 = 250,74 M ²
5.2	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	M2	10,92	0,80 x 2,10 x 5 = 8,40 m ² 0,60 x 2,10 x 2 = 2,52 m ²
6	COBERTURA			
6.1	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada	M2	88,12	10,80 X 4,08 X 2 = 88,12 M ²
6.2	Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm	M2	88,12	10,80 X 4,08 X 2 = 88,12 M ²
6.3	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	M	10,80	10,80 METROS

Alcir

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ

DATA:

30/09/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CÁLCULO
7	PISO			
7.1	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	M2	51,00	$6,96 + 4,37 + 11,10 + 7,20 + 2,40 + 6,19 + 3,60 + 3,12 + 6,06 = 51 \text{ m}^2$
7.2	Camada regularizadora no traço 1:4	M2	51,00	$6,96 + 4,37 + 11,10 + 7,20 + 2,40 + 6,19 + 3,60 + 3,12 + 6,06 = 51 \text{ m}^2$
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	44,94	$6,96 + 4,37 + 11,10 + 7,20 + 2,40 + 6,19 + 3,60 + 3,12 = 44,94 \text{ m}^2$
8	FORRO			
8.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	M2	44,94	$6,96 + 4,37 + 11,10 + 7,20 + 2,40 + 6,19 + 3,60 + 3,12 = 44,94 \text{ m}^2$
8.2	Forro em lambri de PVC	M2	44,94	$6,96 + 4,37 + 11,10 + 7,20 + 2,40 + 6,19 + 3,60 + 3,12 = 44,94 \text{ m}^2$
9	ESQUADRIA			
9.1	Porta em madeira lambrizada	M2	10,92	$0,80 \times 2,10 \times 5 = 8,40 \text{ m}^2$ $0,60 \times 2,10 \times 2 = 2,52 \text{ m}^2$
9.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	M2	7,35	JANELA: $1,00 \times 1,00 \times 3 = 3,00 \text{ m}^2$ $0,40 \times 0,60 \times 3 = 0,72 \text{ m}^2$ $0,40 \times 1,20 \times 1 = 0,48 \text{ m}^2$ PORTA: $1,50 \times 2,10 \times 1 = 3,15 \text{ m}^2$
9.3	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	M2	0,97	JANELA: $1,00 \times 0,13 \times 3 = 0,39 \text{ M}^2$ $0,60 \times 0,13 \times 3 = 0,23 \text{ M}^2$ $1,20 \times 0,13 \times 1 = 0,15 \text{ M}^2$ PORTA: $1,50 \times 0,13 \times 1 = 0,20 \text{ M}^2$
10	HIDROSSANITÁRIA			
10.1	ESGOTO			
10.1.1	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	6,00	6 metros
10.1.2	Tubo em PVC - 75mm (LS)	M	6,00	6 metros
10.1.3	Tubo em PVC - 50mm (LS)	M	18,00	18 metros
10.1.4	Joelho 90º RC em PVC - JS - 75mm-LS	UND	2,00	2 unidades
10.1.5	Joelho 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS	UND	6,00	6 unidades
10.1.6	Te em PVC - JS - 50x50mm-LS	UND	1,00	1 unidade
10.1.7	Redução PVC 75mm x 50mm - LS	UND	1,00	1 unidade
10.1.8	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	UND	1,00	1 unidade
10.1.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00	1 unidade
10.1.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00	4 unidades
10.1.11	Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS	UND	1,00	1 unidade
10.1.12	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto	UND	2,00	2 unidades

A. Ceja

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ

DATA:

30/09/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CÁLCULO
10.1.13	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	UND	1,00	1 unidade
10.1.14	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	UND	1,00	1 unidade
10.2	AGUA FRIA			
10.2.1	Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH)	und	1,00	1 unidade
10.2.2	Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH)	und	2,00	2 unidades
10.2.3	Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH)	und	1,00	1 unidade
10.2.4	Bucha de redução JS 25x20mm (LH)	und	6,00	6 unidades
10.2.5	Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH)	und	4,00	4 unidades
10.2.6	Bucha de redução JS - 50mm x 32mm (LH)	und	1,00	1 unidade
10.2.7	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	1,00	1 unidade
10.2.8	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	7,00	7 unidades
10.2.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	2,00	2 unidades
10.2.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	2,00	2 unidades
10.2.11	Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	und	7,00	7 unidades
10.2.12	Registro de pressao c/ canopla - 3/4"	und	1,00	1 unidade
10.2.13	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00	1 unidade
10.2.14	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00	1 unidade
10.2.15	Tê em PVC - JS - 25mm-LH	und	3,00	3 unidades
10.2.16	Tê em PVC - JS - 32mm-LH	und	4,00	4 unidades
10.2.17	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	6,00	6 unidades
10.2.18	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	18,00	18 unidades
10.2.19	Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	15,00	15 unidades
10.2.20	Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	m	6,00	6 unidades
10.2.21	Reservatório em polietileno de 500 L	und	1,00	1 unidade
10.3	LOUÇAS E METAIS			
10.3.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	und	1,00	1 unidade
10.3.2	Chuveiro em PVC	und	1,00	1 unidade
10.3.3	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	und	3,00	2 unidades

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE


LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ

DATA:

30/09/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CÁLCULO
10.3.4	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	und	1,00	1 unidade
11	ELÉTRICA			
11.1	Eletroduto PVC de 1 1/4"	M	3,00	3 metros
11.2	Eletroduto PVC de 1"	M	122,67	122,67 metros
11.3	Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE)	UND	1,00	1 unidade
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	171,36	171,36 metros
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	148,20	148,20 metros
11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	104,69	104,69 metros
11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	7,19	7,19 metros
11.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	5 unidades
11.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	5 unidades
11.10	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	UND	5,00	5 unidades
11.11	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UND	8,00	8 unidades
11.12	Tomada 2P+T 20A (s/fiação)	UND	3,00	3 unidades
11.13	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	UND	6,00	
11.14	Conjunto Airstop de embutir completo	UND	4,00	4 unidades
11.15	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	UND	2,00	2 unidades
11.16	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UND	6,00	6 unidades
11.17	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	UND	1,00	1 unidade
11.18	Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 15W (sem fiação)	UND	2,00	2 unidades
11.19	Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 25W (sem fiação)	UND	7,00	7 unidades
11.20	Luminária tipo arandela p/ lâmp fluorescente	UND	2,00	2 unidades
11.21	Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)25W - 127V/220V	UND	2,00	2 unidades
11.22	Caixa plástica octogonal	UND	11,00	11 unidades
11.23	Caixa plástica 4"x2"	UND	31,00	31 unidade
11.24	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	UND	1,00	1 unidade

Itaituba - Pa 30 de SETEMBRO de 2020


José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

Jose Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



OBRA: **CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE**
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
GESTOR: Valmir Climaco de Aguiar
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE CALIFÓRNIA ITAITUBA-PARÁ

Cálculo do BDI

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

DEMONSTRATIVO BDI

ITENS		SIGLAS	VALORES
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,43%
SEGURO E GARANTIA		SG	0,28%
RISCO		R	1,00%
DESPESAS FINANCEIRAS		DF	0,94%
LUCRO		L	6,74%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		5,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO		I	13,15%
BDI			29,90%

LIMITE RECOMENDADOS	
INFERIOR	SUPERIOR
3,43%	6,71%
0,28%	0,75%
1,00%	1,74%
0,94%	1,17%
6,74%	9,40%
VARIÁVEL	
20,76%	30,00%


Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)







$$BDI = ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1$$

Itaituba - Pa, 30 de SETEMBRO de 2020


José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8

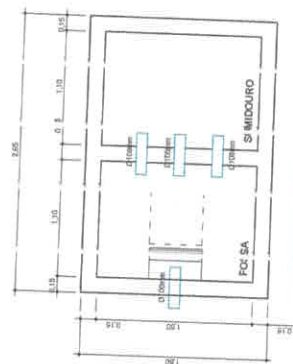

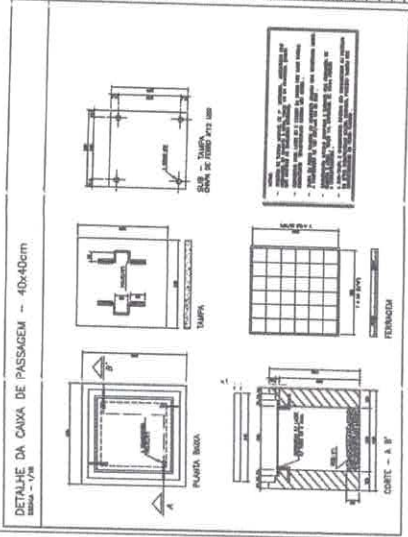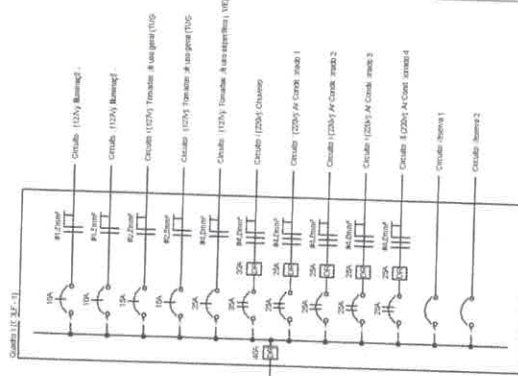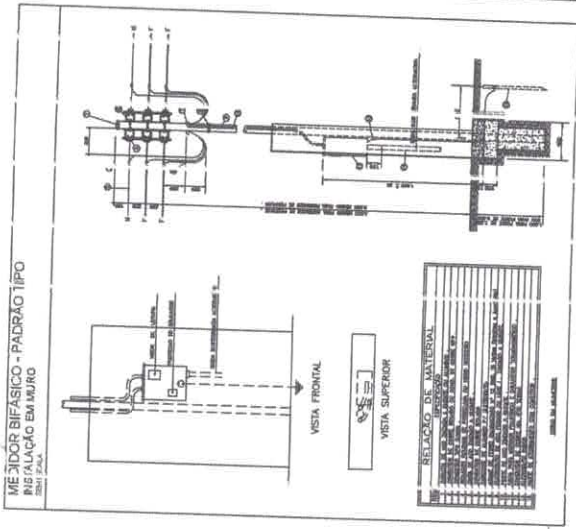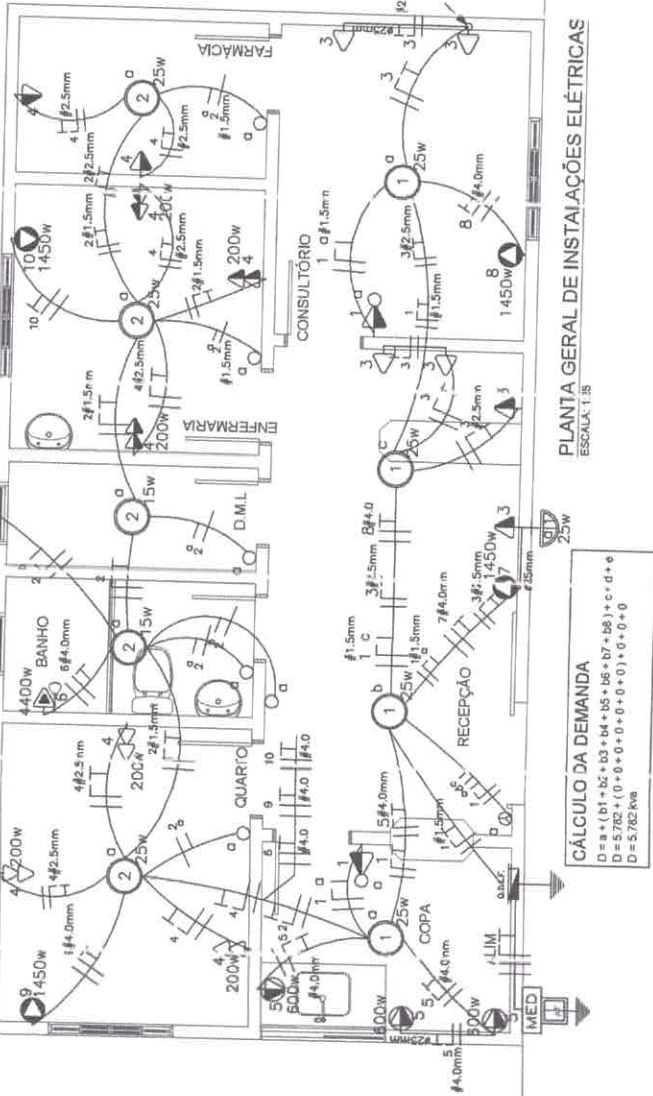

LEGE 1DA


Ass
José Alcyr Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA - PA 151525739-8

[illegible]

ITEM	DISCRIMINACÃO	UNID	QTD
1	ADAPTI DO COM F ANEJO Ø 250 mm	AND.	1,00
2	ADAPTI DO COM F ANEJO Ø 250 mm	AND.	1,00
3	ADAPTI DO COM F ANEJO Ø 250 mm	AND.	1,00
4	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOL. AVE. Ø 250 x 125	AND.	1,00
5	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOL. AVE. Ø 250 x 125	AND.	1,00
6	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOL. AVE. Ø 250 x 125	AND.	1,00
7	CURVA DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00
8	CURVA DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00
9	CURVA DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00
10	CURVA DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00
11	CURVA DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00
12	REGISTRO DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00
13	REGISTRO DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00
14	REGISTRO DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00
15	REGISTRO DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00
16	REGISTRO DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00
17	REGISTRO DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00
18	REGISTRO DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00
19	REGISTRO DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00
20	REGISTRO DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00
21	REGISTRO DE 90° Ø 250 mm	AND.	1,00

LISTA L

TERIA S

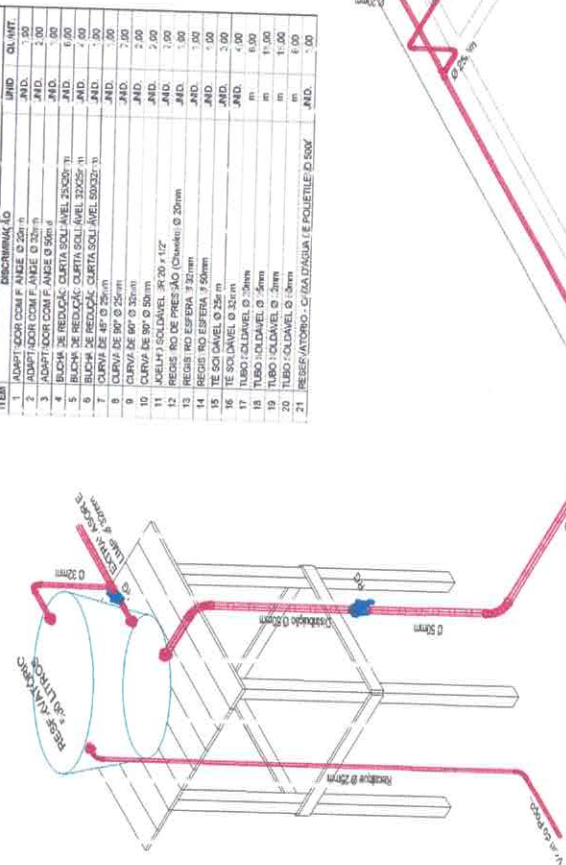

Alcir
 José Alcir Oliveira da Silva Junior
 Engenheiro Civil
 CREA - PA 154525739-8

SEMIFRA DITEC Diretoria Técnica		EQUIPE TÉCNICA: JOSE ALCIRO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR - ENG. CIVIL - CREA PA 154525739-8 LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR - ENG. CIVIL - CREA PA 154525739-8 ANDRÉ LUIZ DA SILVA JUNIOR - ENG. CIVIL - CREA PA 154525739-8 ANDRÉ LUIZ DA SILVA JUNIOR - ENG. CIVIL - CREA PA 154525739-8 ANDRÉ LUIZ DA SILVA JUNIOR - ENG. CIVIL - CREA PA 154525739-8	
ASSUNTO: PROJETO PARA EXECUÇÃO DE UM ORE - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE		RESPOSTA TÉCNICA: RESPOSTA TÉCNICA	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA CNPJ: N.º 08.137.000/01-77		LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	
FOLHA: ÚNICA		COMITADADO CALIFÓRNI	
ESCALA: INDICAÇÃO		CONTEÚDO DA PRONALIA: PROJETO DE HIDRÁULICA	
COORDENADOR: GEOGRAFIA		INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA Planta e Isometria Legenda	
4" 185 3.80" S 58" 21" 1.65" O		DATA: 08/08/2020	

ISOMETRIA - Esc. 1/20

LEGENDA

- ADAPTI DO COM FLANGE
- BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDAVE
- CURVA DE 45°
- CURVA DE 90°
- JOELHO SOLDADO LSR 20 x 1/2"
- REGISTRO DE PRESSÃO
- REGISTRO ESFERA
- TE SOLDAVE

PLANTA BAIXA - Esc. 1/10

